PILASTRO N.23–35

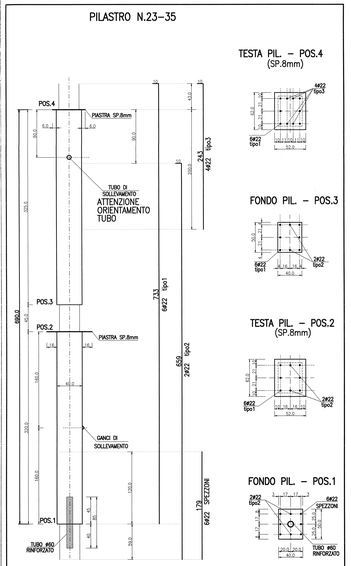

PILASTRO N.12–24

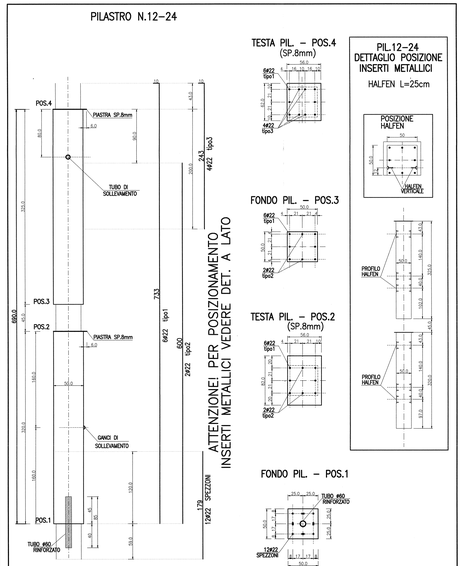

PIL.12–24 DETTAGLIO POSIZIONE INSERTI METALLICI

HALFEN L=25cm

PILASTRO N.22–34

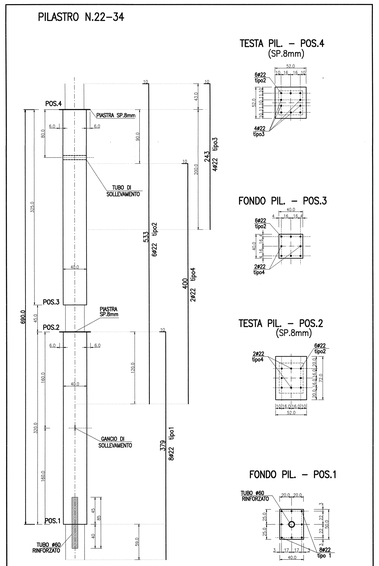

PILASTRO N.13–18–19–20–21
PILASTRO N.25–30–31–32–33

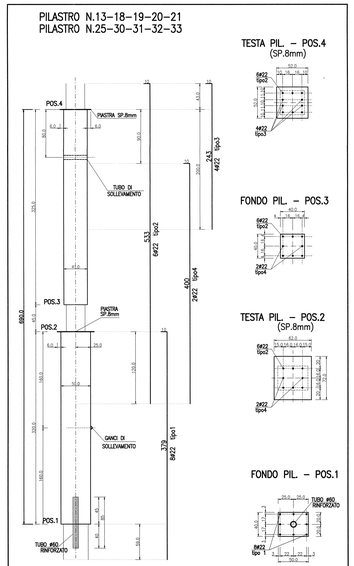

PILASTRO N.17–29

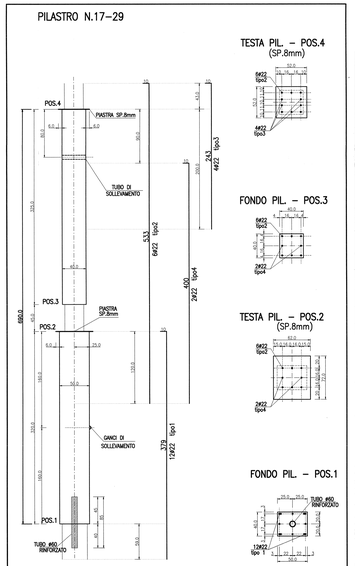

SCHEMA STAFFATURA PILASTRO TIPO



PREVEDERE FORI PER CORDA ANTINFORTUNISTICA ALLA DISTANZA DI 120 cm. DAL FONDO DI OGNI PILASTRO. (NOTA VALIDA PER TUTTI I SOLAI)

PER IL MONTAGGIO DEI PILASTRI IN CANTIERE UTILIZZARE I SEGUENTI SPINOTTI DI SOLLEVAMENTO: SPINOTTO ø70 mm. – cat. APE="A"

STRUTTURE REI 120

MATERIALI

STRUTTURE IN OPERA
E GETTI INTEGRATIVI
PER ELEVAZIONE
CLS Rck >= 300 kg/cmq
GETTI PREFABBRICATI
CLS Rck >= 450 kg/cmq
FERRO Fe B44k [controllato]
ACCIAIO PER PIASTRE E PROFILATI Fe360

PRESCRIZIONI MANUFATTI APE

LA PRESENTE TABELLA E' VALIDA PER QUANTO APPLICABILE ALLA FORNITURA IN OGGETTO

TOLLERANZE DI MONTAGGIO:

- TRACCIAMENTO ORIZZONTALE ..... +/- 15 mm.
- TRACCIAMENTO VERTICALE ..... +/- 10 mm.
- PIOMBATURA PILASTRI ..... +/- 8 mm.

TOLLERANZE GEOMETRIA MANUFATTI:

-TRAVI:
- LUNGHEZZA TOTALE ..... +/- 15 mm.
- ALTRE TOLLERANZE GEOMETRICHE ..... +/- 8 mm.
- FRECCIA VERTICALE +/- 1/700 lunghezza totale mm.

-PILASTRI:
- LUNGHEZZA TOTALE ..... +/- 10 mm.
- ALTRE TOLLERANZE GEOMETRICHE ..... +/- 8 mm.
- CENTRAGGIO TUBO ..... +/- 5 mm.
- FRECCIA VERTICALE +/- 1/700 lunghezza totale mm.

-SCALE:
- ALZATA ..... +/- 1 mm.
- PEDATA ..... +/- 2 mm.
- LUNGHEZZA TOTALE ..... +/- 10 mm.

-INSERTI DI FONDAZIONE:
- DIMENSIONI ..... +/- 5 mm.

-SPESSORE ..... +/- 5 mm.
- LARGHEZZA TOTALE ..... +/- 5 mm.
- LUNGHEZZA TOTALE ..... +/- 8 mm.

-INSERTI DI FONDAZIONE:
- DIMENSIONI ..... +/- 5 mm.

-LASTRE RAMPE CARRABILI:
- SPESSORE ..... +/- 5 mm.
- LARGHEZZA TOTALE ..... +/- 15 mm.
- LUNGHEZZA TOTALE ..... +/- 15 mm.

-GANCI DI SOLLEVAMENTO E INSERTI VARI:
- DISTANZA PROGRESSIVA ..... +/-100 mm.

-GRADINI:
- DIMENSIONI ..... +/- 5 mm.

LA SCARA TOTALE DEGLI SCOSTAMENTI IN TUTTE LE DIREZIONI NON DEVE SUPERARE 30 mm. DIVERSAMENTE IL MONTAGGIO DEVE ESSERE SOSPESO E VE' VERIFICATA LA SITUAZIONE CON LA D.L.
PER MOMENTANEAZIONE, STOCCAGGIO, MONTAGGIO IN OPERA VEDI MANUALE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE APE.

ARE
via L. DA VINCI,14 – 42027 MONTECCHIO EMILIA (RE.)
tel. 0522/863441 r.a. – fax 0522/863115
Internet: http://www.ape.it E-MAIL: ape@ape.it

ICMQ CERTIFICATO N. 9150.

PROT. N°2005/91 SCALA 1:100

Rev.	Date	Descrizione	CONSORZIO CONA Verifica	CONSORZIO CONA Approvato	ARE PREFABBRICATI S.p.A. Verifica	ARE PREFABBRICATI S.p.A. Approvato	Redattore
00	29/10/2007				EMILIANO	SORIANI	GIROLA
01							
02							
03							
04							
05							

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA

COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCISPEDALE SANT'ANNA IN CONA (FE)
TRAMITE CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE

PROGETTO ESECUTIVO (ART. N° 1090 D.

Concessionaria: **PROG.ESTE Spa**
Affidataria lavori di progettazione e costruzione: **CONSORZIO GONA**

IMPRESE COSTRUTTRICI E GESTIONALI

CMB - Carpi (MO) -Mandataria-
COOP. COSTRUZIONI - BO
CMR - Fdo d'Argenta (FE)
CIAB - Bologna
SINTECO - Ferrara
BUSI IMPIANTI - Bologna
SINTECNICAL - Ferrara
Ing.SARTI G.&C. - Poggio R. (FE)
TUBI COSTRUZIONI - Ferrara
DALVA - Ferrara
SIRAM - Milano
HERA - Cassana (FE)
PETROLPERA Estense - Ferrara
CIDAS - Copparo (FE)
C.I.R. - Reggio Emilia
SEBRENSSIMA RIST - Vicenza
COOPSER - Ferrara
COOP SERVICE - Cavriago (RE)
SERVIZI ITALIA - Castellina di S.
Impresa BERTONCELLI - FE

PROGETTISTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI
STUDIO ALTIERI S.p.A. -
Treviso (TV)
H 0 3 6 7 P E

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI
STS Servizi Tecnologici Sistemi S.p.A. - Bologna
0 1 1 7 2

PROGETTAZIONE APPARECCHIATURE
S.TE.P. S.n.c. - Ferrara
0 1 1 7 2

DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO
U.TE.CO. - Ferrara
0 1 1 7 2

Rev.	Date	Descrizione	CONSORZIO CONA Verifica	CONSORZIO CONA Approvato	ARE PREFABBRICATI S.p.A. Verifica	ARE PREFABBRICATI S.p.A. Approvato	Redattore
00	29/10/2007						

Denominazione
CORPO 33
ESECUTIVO PILASTRI 4°-5°LIVELLO - N.13-17-18-19-20-21-25-29-30
- N.31-32-12-33-22-34-23-35-24

Codice elaborato: E 0 0 X X S 1 4 2 2 4 1
Codice commessa: 0 0 0 0 0 F 7.3

FILE: F_E_0_S_142.241_C33PIL.R00
